



**BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL**

Forschungsprojekt-Bericht: Arbeitsschutz

Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft

Version: Endbericht

Druckdatum: 27.10.2017

Hinweis:


Der gegenständige Druckbericht stellt einen automatisierten Auszug aus dem Prozessmodell des Lehr- und Forschungsgebietes für Baubetrieb und Bauwirtschaft dar. Weitere Abfragen und Sichten auf das Modell können auf Nachfrage angefertigt werden.



Inhaltsverzeichnis

1	Ideenklärung/Grundlagenermittlung.....	3
2	Vorplanung/Entwurfsplanung.....	8
3	Genehmigungsverfahren.....	15
3.1	Entwurf der Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen.....	18
4	Ausführungsplanung.....	20
4.1	SiGePlan erstellen; Entwurf.....	30
4.2	Bei der Planprüfung beraten.....	33
4.3	Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen.....	34
5	Vergabe der Bauausführung.....	36
5.1	Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot.....	41
6	Bauausführung.....	43
6.1	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV.....	56
6.2	Projektsicherheitsplan erstellen.....	58
6.3	Leistungen ausführen.....	62
7	Abnahme und Vorbereitung der Nutzung und Instandhaltung.....	77
7.1	Leistungserklärung zusammenstellen.....	89
7.2	Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen.....	94
7.3	Revisionsunterlagen zusammenstellen.....	102
7.4	technische Einweisung in Anlagen umsetzen.....	104
7.5	Wartungsverträge übergeben.....	110
8	Instandhaltung.....	111
8.1	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV.....	120

1 Ideenklärung/Grundlagenermittlung



Prozess	Verantwortlicher	Inputs		Ist Output von...	
		Bezeichnung	Status	Prozess	...mit Verantwortlichem
Ziel und Zweck der Baumaßnahme festlegen	Bauherr(-envertretung)	Motivation zum Vorhaben		Motivation zum Vorhaben benennen	-
Kostenrahmen festlegen	Bauherr(-envertretung)	Zielvorgabe	Freigegeben	Ziel und Zweck der Baumaßnahme festlegen	Bauherr(-envertretung)
Groben Zeitplan aufstellen	Bauherr(-envertretung)	Zielvorgabe	Freigegeben	Ziel und Zweck der Baumaßnahme festlegen	Bauherr(-envertretung)
		Kostenrahmen	Freigegeben	Kostenrahmen festlegen	Bauherr(-envertretung)
Voraussichtliche Gestaltung planen	Bauherr(-envertretung)	Zielvorgabe	Freigegeben	Ziel und Zweck der Baumaßnahme festlegen	Bauherr(-envertretung)
		Kostenrahmen	Freigegeben	Kostenrahmen festlegen	Bauherr(-envertretung)
		Grober Zeitplan	Freigegeben	Groben Zeitplan aufstellen	Bauherr(-envertretung)
Chancen und Risiken prüfen	Bauherr(-envertretung)	Baugrund- und Gründungsgutachten	Freigegeben	Baugrund- und Gründungsgutachten erstellen	Prüfsachverständiger
		Umgebungsbedingungen	Geteilt	Umgebungsbedingungen	-

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				aufnehmen	
		Rahmenbedingungen der Baumaßnahme	Freigegeben	Voraussichtliche Gestaltung planen	Bauherr(-envertretung)
Planer suchen und auswählen	Bauherr(-envertretung)	Nachweis über Arbeitsschutzkenntnisse		AS-Qualifikation bereitstellen	-
		Chancen-Risiken-Konzept	Freigegeben	Chancen und Risiken prüfen	Bauherr(-envertretung)
		Rahmenbedingungen der Baumaßnahme	Freigegeben	Voraussichtliche Gestaltung planen	Bauherr(-envertretung)
		Planervertrag	Freigegeben	Planer suchen und auswählen	Bauherr(-envertretung)
Über die Präventionsinstrumente der BaustellV informieren und beraten	Planung	Planervertrag	Freigegeben	Planer suchen und auswählen	Bauherr(-envertretung)
		Chancen-Risiken-Konzept	Freigegeben	Chancen und Risiken prüfen	Bauherr(-envertretung)
		Rahmenbedingungen der Baumaßnahme	Freigegeben	Voraussichtliche Gestaltung planen	Bauherr(-envertretung)
Entscheidung bzgl. Bestellung eines verantwortlichen Dritten	Bauherr(-envertretung)	Anforderungskatalog zur Baustellenverordnung	Geteilt	Über die Präventionsinstrumente der BaustellV informieren und beraten	Planung
		Entscheidungsprotokoll zur Bestellung des verantwortlichen Dritten	Freigegeben	Entscheidung bzgl. Bestellung eines verantwortlichen Dritten	Bauherr(-envertretung)
Umfang der Baumaßnah-	Planung	Rahmenbedingungen der	Freigegeben	Voraussichtliche Gestal-	Bauherr(-envertretung)


Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
me abschätzen		Baumaßnahme		tung planen	
Bedarf an Vorankündigung, SiGeKo, SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten ermitteln	Planung	Umfangs der Baumaßnahme	1. Bearbeitung	Umfang der Baumaßnahme abschätzen	Planung
		Anforderungskatalog zur Baustellenverordnung	Geteilt	Über die Präventionsinstrumente der BaustellV informieren und beraten	Planung

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Ziel und Zweck der Baumaßnahme festlegen	Bauherr(-envertretung)	Zielvorgabe	Freigegeben	Voraussichtliche Gestaltung planen	Bauherr(-envertretung)
				Kostenrahmen festlegen	Bauherr(-envertretung)
				Groben Zeitplan aufstellen	Bauherr(-envertretung)
Kostenrahmen festlegen	Bauherr(-envertretung)	Kostenrahmen	Freigegeben	Voraussichtliche Gestaltung planen	Bauherr(-envertretung)
				Groben Zeitplan aufstellen	Bauherr(-envertretung)
Groben Zeitplan aufstellen	Bauherr(-envertretung)	Grober Zeitplan	Freigegeben	Voraussichtliche Gestaltung planen	Bauherr(-envertretung)
				Groben Bauablaufplan erstellen	Planung
				Bei der Terminplanung	Koordination


Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				beraten	
Voraussichtliche Gestaltung planen	Bauherr(-envertretung)	Rahmenbedingungen der Baumaßnahme	Freigegeben	Chancen und Risiken prüfen	Bauherr(-envertretung)
				Planer suchen und auswählen	Bauherr(-envertretung)
				Über die Präventionsinstrumente der BaustellV informieren und beraten	Planung
				Umfang der Baumaßnahme abschätzen	Planung
Chancen und Risiken prüfen	Bauherr(-envertretung)	Chancen-Risiken-Konzept	Freigegeben	Planer suchen und auswählen	Bauherr(-envertretung)
				Über die Präventionsinstrumente der BaustellV informieren und beraten	Planung
				SiGePlan erstellen; Entwurf	Koordination
Planer suchen und auswählen	Bauherr(-envertretung)	Planervertrag	Freigegeben	Über die Präventionsinstrumente der BaustellV informieren und beraten	Planung
				Planer suchen und auswählen	Bauherr(-envertretung)
Über die Präventionsinstrumente der BaustellV informieren und beraten	Planung	Anforderungskatalog zur Baustellenverordnung	Geteilt	Entscheidung bzgl. Bestellung eines verantwortlichen Dritten	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				Bedarf an Vorankündigung, SiGeKo, SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten ermitteln	Planung
Entscheidung bzgl. Bestellung eines verantwortlichen Dritten	Bauherr(-envertretung)	Entscheidungsprotokoll zur Bestellung des verantwortlichen Dritten	Freigegeben	Erforderliche AS-Kompetenz bereitstellen	Bauherr(-envertretung)
				Entscheidung bzgl. Bestellung eines verantwortlichen Dritten	Bauherr(-envertretung)
Umfang der Baumaßnahme abschätzen	Planung	Umfangs der Baumaßnahme	1. Bearbeitung	Bedarf an Vorankündigung, SiGeKo, SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten ermitteln	Planung
Bedarf an Vorankündigung, SiGeKo, SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten ermitteln	Planung	Bedarfe zur BaustellV	Geteilt	Planungsleistungen bzgl. AS definieren	Planung


2 Vorplanung/Entwurfsplanung

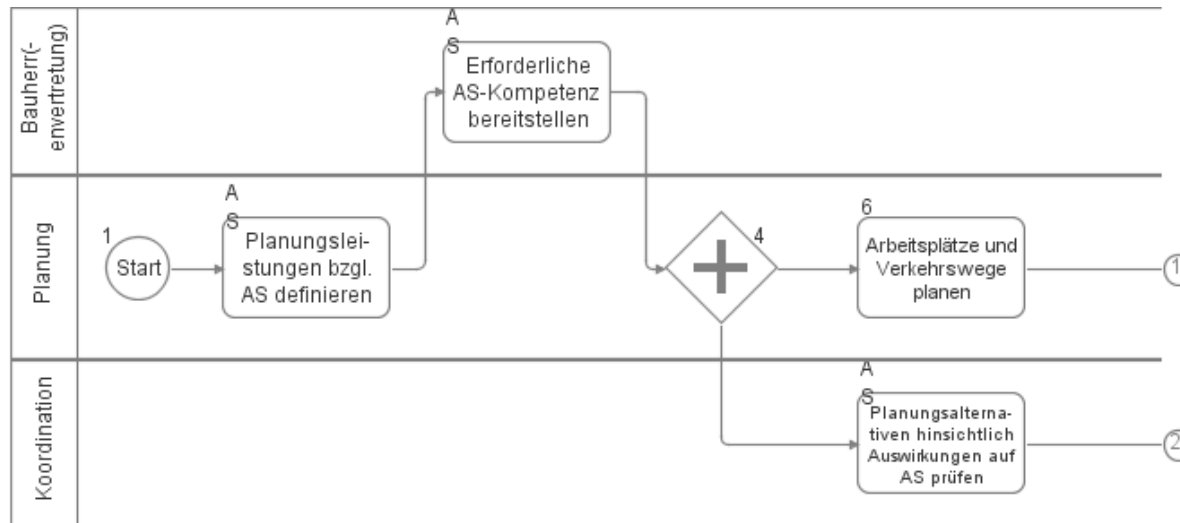

[1/3]

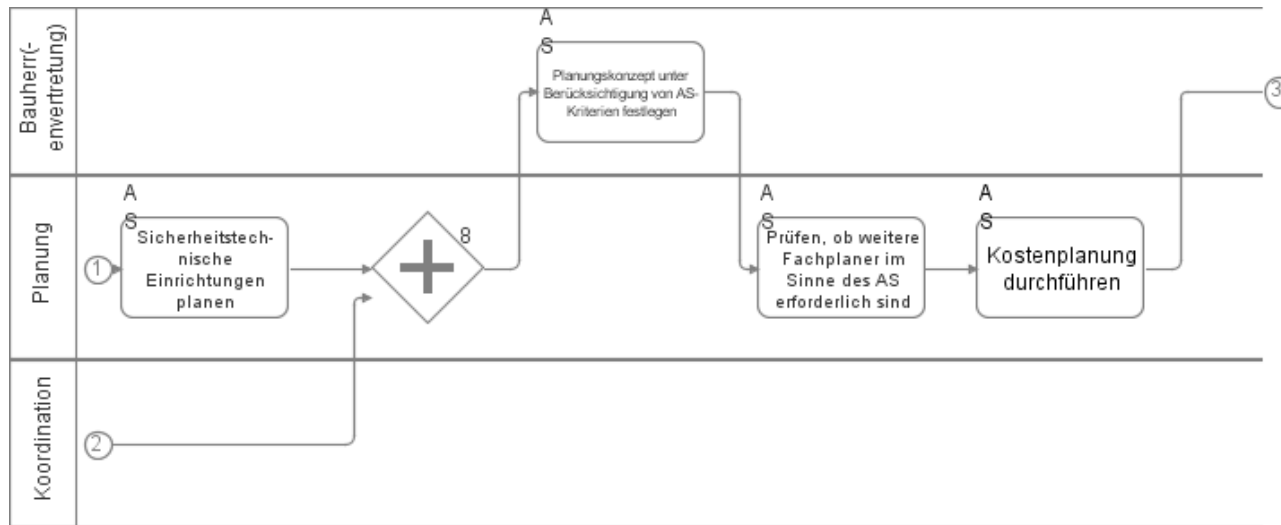

[2 / 3]

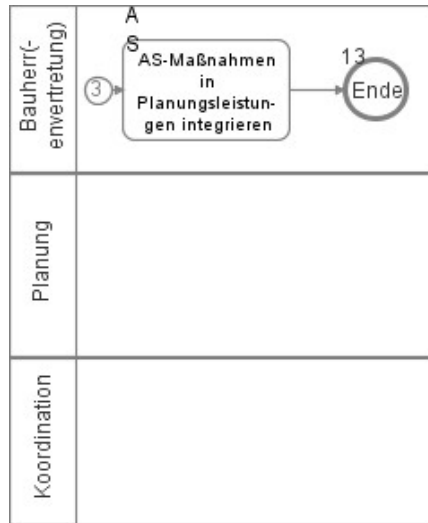

[3 / 3]

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Planungsleistungen bzgl. AS definieren	Planung	Bedarfe zur BaustellV	Geteilt	Bedarf an Vorankündigung, SiGeKo, SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten ermitteln	Planung
Erforderliche AS-Kompetenz bereitstellen	Bauherr(-envertretung)	Leistungsbeschreibung für den Koordinator	Geteilt	Planungsleistungen bzgl. AS definieren	Planung
		Auflistung potentieller Anbieter	Geteilt	Potentielle AS-Anbieter auflisten	-


Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Entscheidungsprotokoll zur Bestellung des verantwortlichen Dritten	Freigegeben	Entscheidung bzgl. Bestellung eines verantwortlichen Dritten	Bauherr(-envertretung)
		Koordinatorenvertrag	Freigegeben	Erforderliche AS-Kompetenz bereitstellen	Bauherr(-envertretung)
Planungsalternativen hinsichtlich Auswirkungen auf AS prüfen	Koordination	Koordinatorenvertrag	Freigegeben	Erforderliche AS-Kompetenz bereitstellen	Bauherr(-envertretung)
		Varianten der Entwurfsplanung	Geteilt	Varianten Entwurfsplanungen erstellen	Planung
Arbeitsplätze und Verkehrswege planen	Planung	Beratungsprotokoll zur Entwurfsplanung	Geteilt	Planungsalternativen hinsichtlich Auswirkungen auf AS prüfen	Koordination
		Nutzungskonzept	Freigegeben	Nutzungskonzept erstellen	-
Sicherheitstechnische Einrichtungen planen	Planung	Beratungsprotokoll zur Entwurfsplanung	Geteilt	Planungsalternativen hinsichtlich Auswirkungen auf AS prüfen	Koordination
		Nutzungskonzept	Freigegeben	Nutzungskonzept erstellen	-
Planungskonzept unter Berücksichtigung von AS-Kriterien festlegen	Bauherr(-envertretung)	Beratungsprotokoll zur Entwurfsplanung	Geteilt	Planungsalternativen hinsichtlich Auswirkungen auf AS prüfen	Koordination
		Entwurfsplanung zu bleibenden Sicherheitseinrichtungen	Geteilt	Sicherheitstechnische Einrichtungen planen	Planung

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Entwurfsplanung zur den Arbeitsplätzen und Verkehrswegen	Geteilt	Arbeitsplätze und Verkehrswege planen	Planung
Prüfen, ob weitere Fachplaner im Sinne des AS erforderlich sind	Planung	Planungskonzept	Freigegeben	Planungskonzept unter Berücksichtigung von AS-Kriterien festlegen	Bauherr(-envertretung)
		Entscheidung über weitere Fachplaner	Geteilt	Prüfen, ob weitere Fachplaner im Sinne des AS erforderlich sind	Planung
Kostenplanung durchführen	Planung	Sicherheitstechnische Kosten- und Mengenansätze	Geteilt	Kosten- und Mengenanätze für sicherheitstechnische Dienstleistungen und Einrichtungen aufstellen	-
		Entscheidung über weitere Fachplaner	Geteilt	Prüfen, ob weitere Fachplaner im Sinne des AS erforderlich sind	Planung
AS-Maßnahmen in Planungsleistungen integrieren	Bauherr(-envertretung)	Sicherheitstechnische Kostenermittlung	Geteilt	Kostenplanung durchführen	Planung
		Anmerkungen der jeweiligen Fachplaner	Geteilt	Anmerkungen der jeweiligen Fachplaner erstellen	-
		Planungskonzept	Freigegeben	Planungskonzept unter Berücksichtigung von AS-Kriterien festlegen	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Planungsleistungen bzgl. AS definieren	Planung	Leistungsbeschreibung für den Koordinator	Geteilt	Erforderliche AS-Kompetenz bereitstellen	Bauherr(-envertretung)
Erforderliche AS-Kompetenz bereitstellen	Bauherr(-envertretung)	Koordinatorenvertrag	Freigegeben	Planungsalternativen hinsichtlich Auswirkungen auf AS prüfen	Koordination
				Erforderliche AS-Kompetenz bereitstellen	Bauherr(-envertretung)
Planungsalternativen hinsichtlich Auswirkungen auf AS prüfen	Koordination	Beratungsprotokoll zur Entwurfsplanung	Geteilt	Arbeitsplätze und Verkehrswege planen	Planung
				Sicherheitstechnische Einrichtungen planen	Planung
				Planungskonzept unter Berücksichtigung von AS-Kriterien festlegen	Bauherr(-envertretung)
Arbeitsplätze und Verkehrswege planen	Planung	Entwurfsplanung zur den Arbeitsplätzen und Verkehrswegen	Geteilt	Planungskonzept unter Berücksichtigung von AS-Kriterien festlegen	Bauherr(-envertretung)
Sicherheitstechnische Einrichtungen planen	Planung	Entwurfsplanung zu bleibenden Sicherheitseinrichtungen	Geteilt	Planungskonzept unter Berücksichtigung von AS-Kriterien festlegen	Bauherr(-envertretung)
Planungskonzept unter Berücksichtigung von AS-Kriterien festlegen	Bauherr(-envertretung)	Planungskonzept	Freigegeben	Prüfen, ob weitere Fachplaner im Sinne des AS erforderlich sind	Planung
				AS-Maßnahmen in Planungsleistungen integrieren	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				ren	
Prüfen, ob weitere Fachplaner im Sinne des AS erforderlich sind	Planung	Entscheidung über weitere Fachplaner	Geteilt	Kostenplanung durchführen	Planung
				Prüfen, ob weitere Fachplaner im Sinne des AS erforderlich sind	Planung
Kostenplanung durchführen	Planung	Sicherheitstechnische Kostenermittlung	Geteilt	AS-Maßnahmen in Planungsleistungen integrieren	Bauherr(-envertretung)
AS-Maßnahmen in Planungsleistungen integrieren	Bauherr(-envertretung)	Entwurfsplanung	Freigegeben	Vorlage für die Genehmigung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erstellen	Planung
				Baustelleneinrichtung planen	Planung
				Bei der Planung der Baustelleneinrichtung beraten	Koordination
				Entwurf der Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination

3 Genehmigungsverfahren

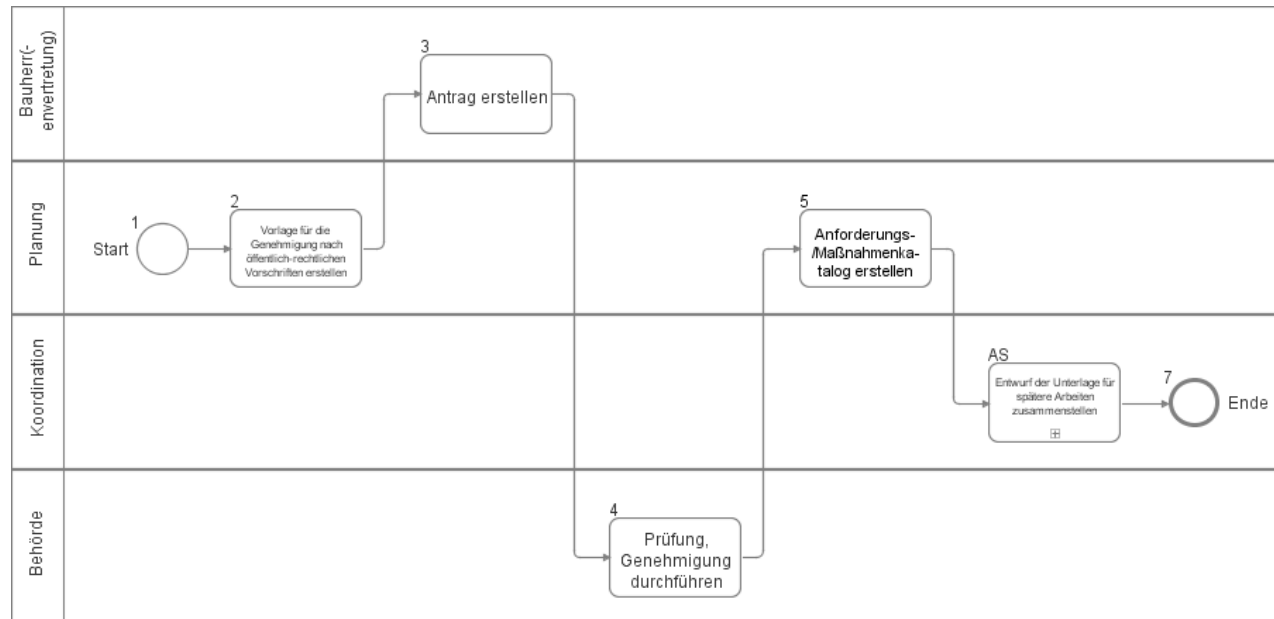


Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
		Prozess		...mit Verantwortlichem	
Vorlage für die Genehmigung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften	Planung	Entwurfsplanung	Freigegeben	AS-Maßnahmen in Planungsleistungen integrieren	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
ten erstellen					
Antrag erstellen	Bauherr(-envertretung)	Vorlage für die Genehmigung	Geteilt	Vorlage für die Genehmigung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erstellen	Planung
Prüfung, Genehmigung durchführen	Behörde	Bauantrag	Freigegeben	Antrag erstellen	Bauherr(-envertretung)
		Amtlich erteilte Genehmigung	Genehmigt	Prüfung, Genehmigung durchführen	Behörde
Anforderungs-/Maßnahmenkatalog erstellen	Planung	Amtlich erteilte Genehmigung	Genehmigt	Prüfung, Genehmigung durchführen	Behörde
Entwurf der Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination	Nutzerbedarfsprogramm	1. Bearbeitung	Nutzerbedarfsprogramm erstellen	Bauherr/Eigentümer
		Funktions-, Raum- und Ausstattungsprogramm	1. Bearbeitung	Funktions-, Raum-, und Ausstattungsprogramm erstellen	Bauherr/Eigentümer
		Betriebskonzept	1. Bearbeitung	Betriebskonzept zusammenstellen	Bauherr/Eigentümer
		Entwurfsplanung	Freigegeben	AS-Maßnahmen in Planungsleistungen integrieren	Bauherr(-envertretung)
		Anforderungs-/Maßnahmenkatalog	Geteilt	Anforderungs-/Maßnahmenkatalog erstellen	Planung
		Baugenehmigung	Genehmigt	Bauantragsunterlagen prüfen und genehmigen	Genehmigungs u. Aufsichtsstelle

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Vorlage für die Genehmigung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erstellen	Planung	Vorlage für die Genehmigung	Geteilt	Antrag erstellen	Bauherr(-envertretung)
Antrag erstellen	Bauherr(-envertretung)	Bauantrag	Freigegeben	Prüfung, Genehmigung durchführen	Behörde
Prüfung, Genehmigung durchführen	Behörde	Amtlich erteilte Genehmigung	Genehmigt	Anforderungs-/Maßnahmenkatalog erstellen	Planung
				Prüfung, Genehmigung durchführen	Behörde
Anforderungs-/Maßnahmenkatalog erstellen	Planung	Anforderungs-/Maßnahmenkatalog	Geteilt	Baustelleneinrichtung planen	Planung
				Bei der Planung der Baustelleneinrichtung beraten	Koordination
				Entwurf der Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination
Entwurf der Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination	Unterlage für spätere Arbeiten	1. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination

3.1 Entwurf der Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen

Verantwortlicher
Koordination




Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Vorliegende Planung analysieren	AS-Aufstellung aus Entwurf und Anforderungskatalog		AS-Details aus Entwurf und Anforderungskatalog ausarbeiten	
Inhalte abstimmen	Aufstellung der Analyseergebnisse	1. Bearbeitung	Vorliegende Planung analysieren	Koordination
Ergebnisse dokumentieren	Aufstellung der abgestimmten Inhalte	1. Bearbeitung	Inhalte abstimmen	Koordination

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Vorliegende Planung analysieren	Aufstellung der Analyseergebnisse	1. Bearbeitung	Inhalte abstimmen	Koordination

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
ren	nisse			
Inhalte abstimmen	Aufstellung der abgestimmten Inhalte	1. Bearbeitung	Ergebnisse dokumentieren	Koordination
Ergebnisse dokumentieren	Aufstellung der abgestimmten Ergebnisse	1. Bearbeitung	Vorliegende Planung analysieren	Koordination

4 Ausführungsplanung

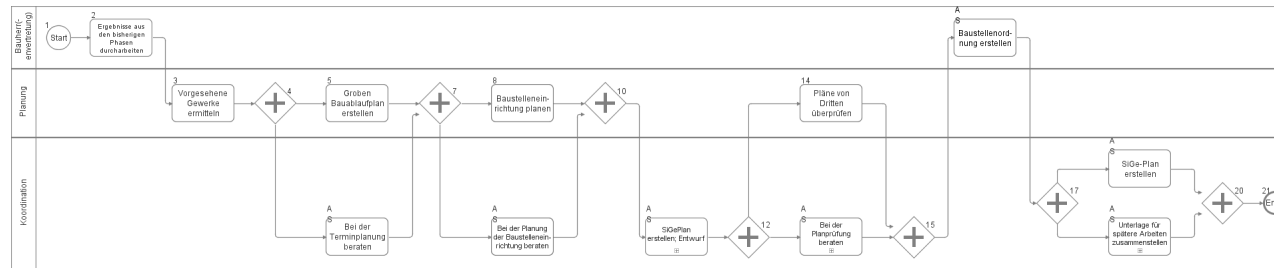

Prozess	Verantwortlicher	Inputs		Ist Output von...	
		Bezeichnung	Status	Prozess	...mit Verantwortlichem
		Ergebnisse aus den bisherigen Phasen durcharbeiten	Bauherr(-envertretung)	Ergebnisse aus bisherigen Phasen	Geteilt
Vorgesehene Gewerke ermitteln	Planung	Ergebnisprotokoll	Freigegeben	Ergebnisse aus den bisherigen Phasen durcharbeiten	Bauherr(-envertretung)
		Auflistung der vorgesehenen Gewerke	Geteilt	Vorgesehene Gewerke ermitteln	Planung
Groben Bauablaufplan erstellen	Planung	Auflistung der vorgesehenen Gewerke	Geteilt	Vorgesehene Gewerke ermitteln	Planung
		Grober Zeitplan	Freigegeben	Groben Zeitplan aufstellen	Bauherr(-envertretung)
		Beratungsprotokoll zur Terminplanung	Geteilt	Bei der Terminplanung beraten	Koordination

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Bei der Terminplanung beraten	Koordination	Grober Bauablaufplan	Geteilt	Groben Bauablaufplan erstellen	Planung
		Grober Zeitplan	Freigegeben	Groben Zeitplan aufstellen	Bauherr(-envertretung)
		Auflistung der vorgesehenen Gewerke	Geteilt	Vorgesehene Gewerke ermitteln	Planung
Baustelleneinrichtung planen	Planung	Anforderungs-/Maßnahmenkatalog	Geteilt	Anforderungs-/Maßnahmenkatalog erstellen	Planung
		Entwurfsplanung	Freigegeben	AS-Maßnahmen in Planungsleistungen integrieren	Bauherr(-envertretung)
		Baugrund- und Gründungsgutachten	Freigegeben	Baugrund- und Gründungsgutachten erstellen	Prüfsachverständiger
		Umgebungsbedingungen	Geteilt	Umgebungsbedingungen aufnehmen	-
		Grober Bauablaufplan	Geteilt	Groben Bauablaufplan erstellen	Planung
		Lageplan	Geteilt	Lageplan erstellen	-
		Verkehrsrechtliche Anordnung	Freigegeben	Verkehrsrechtliche Anordnung erstellen	-
		Bedarfsplanung für Baustelleninfrastruktur	Geteilt	Bedarfsplanung für Baustelleninfrastruktur aufstellen	-
		Versorgerpläne	Freigegeben	Versorgerpläne erstellen	-

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Beratungsprotokoll zur Baustelleneinrichtung	Geteilt	Bei der Planung der Baustelleneinrichtung beraten	Koordination
Bei der Planung der Baustelleneinrichtung beraten	Koordination	Anforderungs-/Maßnahmenkatalog	Geteilt	Anforderungs-/Maßnahmenkatalog erstellen	Planung
		Baustelleneinrichtungsplan	Geteilt	Baustelleneinrichtung planen	Planung
		Entwurfsplanung	Freigegeben	AS-Maßnahmen in Planungsleistungen integrieren	Bauherr(-envertretung)
		Baugrund- und Gründungsgutachten	Freigegeben	Baugrund- und Gründungsgutachten erstellen	Prüfsachverständiger
		Umgebungsbedingungen	Geteilt	Umgebungsbedingungen aufnehmen	-
		Grober Bauablaufplan	Geteilt	Groben Bauablaufplan erstellen	Planung
		Lageplan	Geteilt	Lageplan erstellen	-
		Verkehrsrechtliche Anordnung	Freigegeben	Verkehrsrechtliche Anordnung erstellen	-
		Bedarfsplanung für Baustelleninfrastruktur	Geteilt	Bedarfsplanung für Baustelleninfrastruktur aufstellen	-
		Versorgerpläne	Freigegeben	Versorgerpläne erstellen	-
SiGePlan erstellen; Entwurf	Koordination	Allgemeine Baubeschreibung	Freigegeben	Allgemeine Baubeschreibung erstellen	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Baustelleneinrichtungsplan	Geteilt	Baustelleneinrichtung planen	Planung
		Grober Bauablaufplan	Geteilt	Groben Bauablaufplan erstellen	Planung
		Chancen-Risiken-Konzept	Freigegeben	Chancen und Risiken prüfen	Bauherr(-envertretung)
		Ausführungsplanung TGA	Geteilt	TGA-Ausführungsplanung teilen	TGA-Planer
		Ausführungsplanung TWP	Geteilt	Tragwerksausführungsplanung versenden	Tragwerksplaner
		Ausführungsplanung SF	Geteilt	Sonstige Fachplanung Ausführungsplanung versenden	sonstige Fachplaner
		Ausführungsplanung OP	Geteilt	Architektonische Ausführungsplanung teilen	Objektplaner
Bei der Planprüfung beraten	Koordination	Pläne von Dritten	Geteilt	Pläne von Dritten erstellen	-
Pläne von Dritten überprüfen	Planung	Protokoll zur Planprüfung	Geteilt	Bei der Planprüfung beraten	Koordination
Baustellenordnung erstellen	Bauherr(-envertretung)	SiGePlan	1. Bearbeitung	SiGePlan erstellen; Entwurf	Koordination
		Auflistung der Projektbeteiligten	Geteilt	Projektbeteiligte erstellen	-
		Bauherrn- bzw. projekts-	Freigegeben	Bauherrn- oder projekts-	-

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		pezifische Anforderungen		pezifische Anforderungen aufstellen	
SiGe-Plan erstellen	Koordination	Baustellenordnung	Freigegeben	Baustellenordnung erstellen	Bauherr(-envertretung)
		Planprüfung	Geteilt	Pläne von Dritten überprüfen	Planung
		SiGePlan	1. Bearbeitung	SiGePlan erstellen; Entwurf	Koordination
		Protokoll zur Planprüfung	Geteilt	Bei der Planprüfung beraten	Koordination
		Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben	Bauherr/Eigentümer
		Terminplan Ausführungsplanung	Freigegeben	Terminplan Ausführungsplanung prüfen und freigeben	Bauherr/Eigentümer
		Steuerungsterminplan - Ausführungsplanung	Freigegeben	Terminplan Ausführungsplanung prüfen und freigeben	Bauherr/Eigentümer
		Projekthandbuch Ausführungsplanung	Freigegeben	Projekthandbuch Ausführungsplanung freigeben	Bauherr/Eigentümer
Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination	Planprüfung	Geteilt	Pläne von Dritten überprüfen	Planung
		Unterlage für spätere Arbeiten	1. Bearbeitung	Entwurf der Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Protokoll zur Planprüfung	Geteilt	Bei der Planprüfung beraten	Koordination
		Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben	Bauherr/Eigentümer
		Betreiberkonzept	2. Bearbeitung	Betreiberkonzept fort-schreiben	Bauherr/Eigentümer

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Ergebnisse aus den bisherigen Phasen durcharbeiten	Bauherr(-envertretung)	Ergebnisprotokoll	Freigegeben	Vorgesehene Gewerke ermitteln	Planung
Vorgesehene Gewerke ermitteln	Planung	Auflistung der vorgesehenen Gewerke	Geteilt	Groben Bauablaufplan erstellen	Planung
				Bei der Terminplanung beraten	Koordination
				Vorgesehene Gewerke ermitteln	Planung
Groben Bauablaufplan erstellen	Planung	Grober Bauablaufplan	Geteilt	Bei der Terminplanung beraten	Koordination
				Baustelleneinrichtung planen	Planung
				Bei der Planung der Bau-	Koordination

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				stelleneinrichtung beraten	
				SiGePlan erstellen; Entwurf	Koordination
Bei der Terminplanung beraten	Koordination	Beratungsprotokoll zur Terminplanung	Geteilt	Groben Bauablaufplan erstellen	Planung
Baustelleneinrichtung planen	Planung	Baustelleneinrichtungsplan	Geteilt	Bei der Planung der Baustelleneinrichtung beraten	Koordination
				Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot	Ausführendes Unternehmen
				SiGePlan erstellen; Entwurf	Koordination
Bei der Planung der Baustelleneinrichtung beraten	Koordination	Beratungsprotokoll zur Baustelleneinrichtung	Geteilt	Baustelleneinrichtung planen	Planung
SiGePlan erstellen; Entwurf	Koordination	SiGePlan	1. Bearbeitung	Baustellenordnung erstellen	Bauherr(-envertretung)
				SiGe-Plan erstellen	Koordination
				Fachausführungsplanungen prüfen und integrieren	Objektplaner
				Fachausführungsplanungen prüfen und integrieren	Objektplaner
Bei der Planprüfung beraten	Koordination	Protokoll zur Planprüfung	Geteilt	Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				Pläne von Dritten überprüfen	Planung
				SiGe-Plan erstellen	Koordination
Pläne von Dritten überprüfen	Planung	Planprüfung	Geteilt	Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination
				SiGe-Plan erstellen	Koordination
Baustellenordnung erstellen	Bauherr(-envertretung)	Baustellenordnung	Freigegeben	Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen aufstellen	Planung
				Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot	Ausführendes Unternehmen
				Unterlagen zum Bauablauf auf Vollständigkeit prüfen	Bauherr(-envertretung)
				Arbeitsverfahren vorbereiten	Ausführendes Unternehmen
				Unterweisung durchführen	Ausführendes Unternehmen
				Leistungsbeschreibungen und Leistungsverzeichnis erstellen	Objektplaner
				SiGe-Plan erstellen	Koordination
SiGe-Plan erstellen	Koordination	SiGePlan	2. Bearbeitung	Unterlagen zum Bauablauf auf Vollständigkeit	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				prüfen	
				Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen aufstellen	Planung
				Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot	Ausführendes Unternehmen
				Arbeitsverfahren vorbereiten	Ausführendes Unternehmen
				Unterweisung durchführen	Ausführendes Unternehmen
				Leistungsbeschreibungen und Leistungsverzeichnis erstellen	Objektplaner
Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination	Unterlage für spätere Arbeiten	2. Bearbeitung	Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen aufstellen	Planung
				Unterlagen zum Bauablauf auf Vollständigkeit prüfen	Bauherr(-envertretung)
				Unterlage für spätere Arbeiten übergeben	Bauherr(-envertretung)
				Bauleistung abnehmen	Bauherr(-envertretung)
				Leistungsbeschreibungen und Leistungsverzeichnis erstellen	Objektplaner

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				Mitwirkung bei der fach- technischen Abnahme	Bauherr/Eigentümer

4.1 SiGePlan erstellen; Entwurf

Verantwortlicher

Koordination



Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Relevante Gefährdungen ermitteln	Aufstellung der SiGePlan-relevanten Vorinformationen	1. Bearbeitung	AS-relevante Vorinformationen erstellen	
	Auflistung der Gefährdungen	1. Bearbeitung	Relevante Gefährdungen ermitteln	Koordination
Gefährdungen zur voraussichtlichen Arbeitsabfolge zuordnen	Auflistung der Gefährdungen	1. Bearbeitung	Relevante Gefährdungen ermitteln	Koordination
Schutzmaßnahmen benennen	Auflistung der zugeordneten Gefährdungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen zur voraussichtlichen Arbeitsabfolge zuordnen	Koordination
Abhängigkeiten im Bauablauf berücksichtigen	Auflistung der zugeordneten Schutzmaßnahmen	1. Bearbeitung	Schutzmaßnahmen benennen	Koordination
Inhalte abstimmen	Auflistung der gewerkeübergreifenden Schutzmaßnahmen	1. Bearbeitung	Abhängigkeiten im Bauablauf berücksichtigen	Koordination


Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Auflistung der zugeordneten Schutzmaßnahmen	1. Bearbeitung	Schutzmaßnahmen benennen	Koordination
	Auflistung der zugeordneten Gefährdungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen zur voraussichtlichen Arbeitsabfolge zuordnen	Koordination
	Auflistung der Gefährdungen	1. Bearbeitung	Relevante Gefährdungen ermitteln	Koordination
Ergebnisse dokumentieren	Aufstellung der abgestimmten Inhalte zum SiGePlan	1. Bearbeitung	Inhalte abstimmen	Koordination

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Relevante Gefährdungen ermitteln	Auflistung der Gefährdungen	1. Bearbeitung	Inhalte abstimmen	Koordination
			Gefährdungen zur voraussichtlichen Arbeitsabfolge zuordnen	Koordination
			Relevante Gefährdungen ermitteln	Koordination
Gefährdungen zur voraussichtlichen Arbeitsabfolge zuordnen	Auflistung der zugeordneten Gefährdungen	1. Bearbeitung	Schutzmaßnahmen benennen	Koordination
			Inhalte abstimmen	Koordination
Schutzmaßnahmen benennen	Auflistung der zugeordneten Schutzmaßnahmen	1. Bearbeitung	Inhalte abstimmen	Koordination
			Abhängigkeiten im Bauablauf berücksichtigen	Koordination
Abhängigkeiten im Bauablauf	Auflistung der gewerkeüber-	1. Bearbeitung	Inhalte abstimmen	Koordination

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
berücksichtigen	greifenden Schutzmaßnahmen			
Inhalte abstimmen	Aufstellung der abgestimmten Inhalte zum SiGePlan	1. Bearbeitung	Ergebnisse dokumentieren	Koordination
Ergebnisse dokumentieren	Aufstellung der abgestimmten Ergebnisse zum SiGePlan	1. Bearbeitung		

4.2 Bei der Planprüfung beraten

Verantwortlicher
Koordination




Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Sicherheitsrelevante Erkenntnisse ausarbeiten	AS-Details aus Plänen Dritter		AS-Details aus Plänen Dritter ausarbeiten	

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Sicherheitsrelevante Erkenntnisse ausarbeiten	Aufstellung der sicherheitsrelevanten Erkenntnisse	1. Bearbeitung	Vorliegende Planung analysieren	Koordination

4.3 Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen


Verantwortlicher
Koordination



Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Vorliegende Planung analysieren	Aufstellung der abgestimmten Ergebnisse	1. Bearbeitung	Ergebnisse dokumentieren	Koordination
	Aufstellung der sicherheitsrelevanten Erkenntnisse	1. Bearbeitung	Sicherheitsrelevante Erkenntnisse ausarbeiten	Koordination
Inhalte abstimmen	Aufstellung der Analyseergebnisse	2. Bearbeitung	Vorliegende Planung analysieren	Koordination
Ergebnisse dokumentieren	Aufstellung der abgestimmten Inhalte	2. Bearbeitung	Inhalte abstimmen	Koordination

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Vorliegende Planung analysieren	Aufstellung der Analyseergebnisse	2. Bearbeitung	Inhalte abstimmen	Koordination
Inhalte abstimmen	Aufstellung der abgestimmten Inhalte	2. Bearbeitung	Ergebnisse dokumentieren	Koordination
Ergebnisse dokumentieren	Aufstellung der abgestimmten Ergebnisse	2. Bearbeitung		

5 Vergabe der Bauausführung

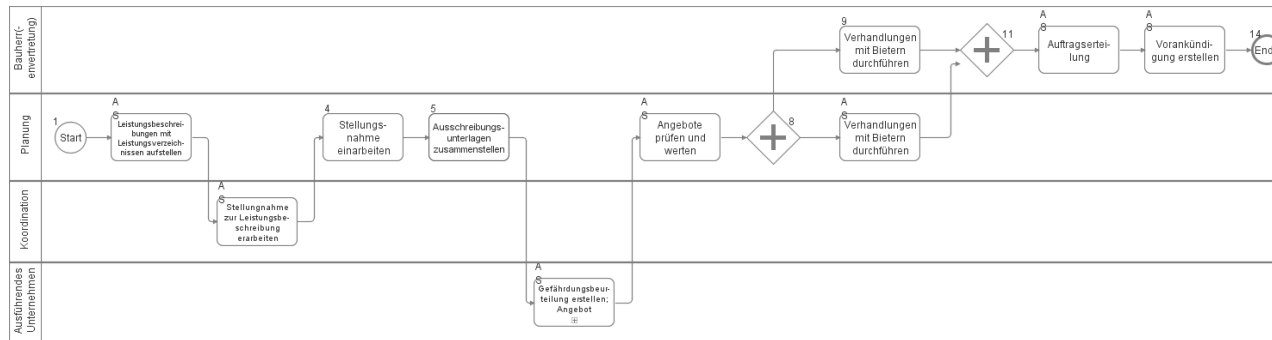

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen aufstellen	Planung	SiGePlan	2. Bearbeitung	SiGe-Plan erstellen	Koordination
		Unterlage für spätere Arbeiten	2. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination
		Baustellenordnung	Freigegeben	Baustellenordnung erstellen	Bauherr(-envertretung)
Stellungnahme zur Leistungsbeschreibung erarbeiten	Koordination	Leistungsbeschreibung	1. Bearbeitung	Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen aufstellen	Planung
Stellungnahme einarbeiten	Planung	Stellungnahme zum LV	Geteilt	Stellungnahme zur Leistungsbeschreibung erarbeiten	Koordination

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Leistungsbeschreibung	1. Bearbeitung	Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen aufstellen	Planung
Ausschreibungsunterlagen zusammenstellen	Planung	Leistungsbeschreibung	Geteilt	Stellungnahme einarbeiten	Planung
Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot	Ausführendes Unternehmen	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
		Protokoll Baufeldbegehung	1. Bearbeitung	Baufeld besichtigen	Ausführendes Unternehmen
		SiGePlan	2. Bearbeitung	SiGe-Plan erstellen	Koordination
		Ausschreibungsunterlagen	Geteilt	Ausschreibungsunterlagen zusammenstellen	Planung
		Baustellenordnung	Freigegeben	Baustellenordnung erstellen	Bauherr(-envertretung)
		Gewerkespezifische Gefährdungsfaktoren	1. Bearbeitung	Gewerkespezifische Gefährdungsfaktoren ermitteln	Koordination
		Baustelleneinrichtungsplan	Geteilt	Baustelleneinrichtung planen	Planung
		Geplante Arbeitsmittel/Arbeitsverfahren/Arbeitsstoffe	1. Bearbeitung	Geplante Arbeitsmittel/Arbeitsverfahren/Arbeitsstoffe aufstellen	Ausführendes Unternehmen
		BE-Konzept Angebot	1. Bearbeitung	BE-Konzept aufstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Terminplan	1. Bearbeitung	Grobtermine planen	Ausführendes Unternehmen
		Baustelleneinrichtungsplan	1. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
Angebote prüfen und werten	Planung	Angebot	Geteilt	Angebot einreichen	Ausführendes Unternehmen
Verhandlungen mit Bietern durchführen	Bauherr(-envertretung)	Geprüftes und gewertetes Angebot	Geteilt	Angebote prüfen und werten	Planung
Verhandlungen mit Bietern durchführen	Planung	Geprüftes und gewertetes Angebot	Geteilt	Angebote prüfen und werten	Planung
Auftragserteilung	Bauherr(-envertretung)	Verhandlungsprotokoll	Freigegeben	Verhandlungen mit Bietern durchführen	Bauherr(-envertretung)
		Arbeitsschutzrelevante Informationen im Verhandlungsprotokoll	Geteilt	Verhandlungen mit Bietern durchführen	Planung
		Auftrag	Freigegeben	Auftragserteilung	Bauherr(-envertretung)
Vorankündigung erstellen	Bauherr(-envertretung)	Baustellenorganisation u. -logistik BH	Geteilt	Mitwirkung bei der Prüfung logistischer Einflussgröße	Bauherr/Eigentümer Projektsteuerer
		Projekthandbuch Vergabe	Freigegeben	Projekthandbuch abstimmen und teilen	Bauherr/Eigentümer
		Terminplan AV	Freigegeben	Terminplanung steuern und freigeben	Bauherr/Eigentümer
		Informationen zur Voran-	Geteilt	Informationen zur Voran-	-

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		kündigung		kündigung zusammenstellen	
Verhandlungen mit Bietern durchführen	Koordination				


Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen aufstellen	Planung	Leistungsbeschreibung	1. Bearbeitung	Stellungnahme zur Leistungsbeschreibung erarbeiten	Koordination
				Stellungnahme einarbeiten	Planung
Stellungnahme zur Leistungsbeschreibung erarbeiten	Koordination	Stellungnahme zum LV	Geteilt	Stellungnahme einarbeiten	Planung
Stellungnahme einarbeiten	Planung	Leistungsbeschreibung	Geteilt	Ausschreibungsunterlagen zusammenstellen	Planung
Ausschreibungsunterlagen zusammenstellen	Planung	Ausschreibungsunterlagen	Geteilt	Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot	Ausführendes Unternehmen	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen
				Nebenleistungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Angebote prüfen und werten	Planung	Geprüftes und gewertetes Angebot	Geteilt	Verhandlungen mit Bietern durchführen	Bauherr(-envertretung)
				Verhandlungen mit Bietern durchführen	Planung
Verhandlungen mit Bietern durchführen	Bauherr(-envertretung)	Verhandlungsprotokoll	Freigegeben	Auftragserteilung	Bauherr(-envertretung)
Verhandlungen mit Bietern durchführen	Planung	Arbeitsschutzrelevante Informationen im Verhandlungsprotokoll	Geteilt	Auftragserteilung	Bauherr(-envertretung)
Auftragserteilung	Bauherr(-envertretung)	Auftrag	Freigegeben	Auftragserteilung	Bauherr(-envertretung)
Vorankündigung erstellen	Bauherr(-envertretung)	Vorankündigung	Freigegeben	Unterlagen zum Bauablauf auf Vollständigkeit prüfen	Bauherr(-envertretung)
				Baustelleneinrichtungs- und Logistikplanung auf Einhaltung der Vorschriften prüfen	Genehmigungs u. Aufsichtsstelle
				Vorankündigung erhalten	-
Verhandlungen mit Bietern durchführen	Koordination				

5.1 Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen



Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Auflistung Abschlussbemerkungen	1. Bearbeitung	Abschlussbemerkungen erstellen	Ausführendes Unternehmen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit	Ausführendes Unternehmen
	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen	Ausführendes Unternehmen
	RB BE		Randbedingungen BE erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	sonst. Bestandsmedien		sonstige Bestandsmedien erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Fotos		Fotodokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungen ermitteln	Aufstellung der Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	1. Bearbeitung	Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungen bewerten	Auflistung der Gefährdungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
Schutzmaßnahmen festlegen	Auflistung der Gefährdungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
	Aufstellung der Gefährdungsbewertungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen bewerten	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Aufstellung der Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	1. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungen ermitteln	Auflistung der Gefährdungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen bewerten	Ausführendes Unternehmen
			Schutzmaßnahmen festlegen	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungen bewerten	Aufstellung der Gefährdungsbewertungen	1. Bearbeitung	Schutzmaßnahmen festlegen	Ausführendes Unternehmen
Schutzmaßnahmen festlegen	Aufstellung der Schutzmaßnahmen	1. Bearbeitung		

6 Bauausführung

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Unterlagen zum Bauablauf auf Vollständigkeit prüfen	Bauherr(-envertretung)	SiGePlan	2. Bearbeitung	SiGe-Plan erstellen	Koordination
		Unterlage für spätere Arbeiten	2. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination
		Vorankündigung	Freigegeben	Vorankündigung erstellen	Bauherr(-envertretung)
		Baustellenordnung	Freigegeben	Baustellenordnung erstellen	Bauherr(-envertretung)
		Verkehrsrechtliche Anordnung	Freigegeben	Verkehrsrechtliche Anordnung erstellen	-
		Umgebungsbedingungen	Geteilt	Umgebungsbedingungen aufnehmen	-
		Arbeitsschutzunterlagen der Gewerke	Geteilt	Arbeitsschutzunterlagen der Gewerke erstellen	-
		Arbeits- und Sicherheitsplan	Geteilt	Arbeits- und Sicherheitsplan erstellen	-
		Bestätigung Kampfmittelfreiheit	Freigegeben	Bestätigung Kampfmittelfreiheit einholen	-
Arbeitsverfahren vorbereiten	Ausführendes Unternehmen	Weiterführende Hinweise zum Arbeitsschutz	Freigegeben	Unterlagen zum Bauablauf auf Vollständigkeit prüfen	Bauherr(-envertretung)
		SiGePlan	2. Bearbeitung	SiGe-Plan erstellen	Koordination
		Baustellenordnung	Freigegeben	Baustellenordnung erstellen	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Arbeits- und Sicherheitsplan	Geteilt	Arbeits- und Sicherheitsplan erstellen	-
Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen	Arbeitsschutzmanagementsystem	1. Bearbeitung	Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen	Ausführendes Unternehmen
		Projektspezifische Information für die GB; AV	Freigegeben	Arbeitsverfahren vorbereiten	Ausführendes Unternehmen
		Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot	Ausführendes Unternehmen
Unterweisung durchführen	Ausführendes Unternehmen	Baustellenordnung	Freigegeben	Baustellenordnung erstellen	Bauherr(-envertretung)
		SiGePlan	2. Bearbeitung	SiGe-Plan erstellen	Koordination
		Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen
Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen
		Unterweisungsnachweis	Freigegeben	Unterweisung durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen	Ausführendes Unternehmen
		Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen	Ausführendes Unternehmen
		Baustelleneinrichtungs-	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungs-	Ausführendes Unterneh-

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		plan AV		plan fortschreiben	men
		Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Montageplan	1. Bearbeitung	Montageplanung erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen	Ausführendes Unternehmen
Bei der Vorbereitung des Baustellenbetriebs beraten	Koordination	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
Baustellenbetrieb vorbereiten	Bauherr(-envertretung)	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Beratungsprotokoll	Geteilt	Bei der Vorbereitung des Baustellenbetriebs beraten	Koordination
Objekt- und Bauablaufüberwachung abstimmen	Bauherr(-envertretung)	Optimierter Bauablaufplan	Freigegeben	Baustellenbetrieb vorbereiten	Bauherr(-envertretung)
SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen	Koordination	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Abstimmungsprotokoll	Freigegeben	Objekt- und Bauablaufüberwachung abstimmen	Bauherr(-envertretung)
		Beratungsprotokoll	Geteilt	Bei der Vorbereitung des Baustellenbetriebs beraten	Koordination

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Projekthandbuch Vergabe	Freigegeben	Projekthandbuch abstimmen und teilen	Bauherr/Eigentümer
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben	Ausführendes Unternehmen	SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen	Koordination
		Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen
		Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen	Ausführendes Unternehmen
		Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen	Ausführendes Unternehmen
Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen	Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung fortschreiben	Ausführendes Unternehmen
		Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
		SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen	Koordination
		Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen	Ausführendes Unternehmen
Leistungen ausführen	Ausführendes Unternehmen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen	Ausführendes Unternehmen
		Lieferschein extern	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben	Ausführendes Unternehmen
		Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Lieferschein intern	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen	Ausführendes Unternehmen
		Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammensstellen	Ausführendes Unternehmen
		Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen	Ausführendes Unternehmen
		Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen	Ausführendes Unternehmen
		Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben	Ausführendes Unternehmen
		Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen	Ausführendes Unternehmen
		Überarbeitetes Nebenleistungs-LV	2. Bearbeitung	Nebenleistungen anpassen	Ausführendes Unternehmen
		Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen
Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen	Ausführendes Unternehmen
Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Wirksamkeitsbestätigung	Freigegeben	Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen
		Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen	Ausführendes Unternehmen
Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Koordination	Dokumentiertes Arbeitsverfahren	Geteilt	Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Optimierter Bauablaufplan	Freigegeben	Baustellenbetrieb vorbereiten	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				reiten	
		SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen	Koordination
Sicherheitsbesprechungen organisieren und durchführen	Koordination	Protokoll der Überwachung	1. Bearbeitung	Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Koordination
Sicherheitsbegehungen organisieren und durchführen	Koordination	Protokoll der Sicherheitsbesprechungen	1. Bearbeitung	Sicherheitsbesprechungen organisieren und durchführen	Koordination
Sicherheitseinrichtungen überprüfen	Koordination	SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen	Koordination
Dokumentation auswerten	Koordination	Protokoll der Überwachung	1. Bearbeitung	Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Koordination
		Protokoll der Sicherheitsbesprechungen	1. Bearbeitung	Sicherheitsbesprechungen organisieren und durchführen	Koordination
		Protokoll der Sicherheitsbegehungen	1. Bearbeitung	Sicherheitsbegehungen organisieren und durchführen	Koordination
		Protokoll der Überprüfung	1. Bearbeitung	Sicherheitseinrichtungen überprüfen	Koordination
Bauleitung durchführen	Bauherr(-envertretung)	Protokoll der Arbeitsergebnisse	Geteilt	Dokumentation auswerten	Koordination
		Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung	Ausführendes Unterneh-

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				fortschreiben	men
		SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen	Koordination

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Unterlagen zum Bauablauf auf Vollständigkeit prüfen	Bauherr(-envertretung)	Weiterführende Hinweise zum Arbeitsschutz	Freigegeben	Arbeitsverfahren vorbereiten	Ausführendes Unternehmen
Arbeitsverfahren vorbereiten	Ausführendes Unternehmen	Projektspezifische Information für die GB; AV	Freigegeben	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Unterweisung durchführen	Ausführendes Unternehmen
				Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Gefährdungsbeurteilung fortschreiben	Ausführendes Unternehmen
Unterweisung durchführen	Ausführendes Unternehmen	Unterweisungsnachweis	Freigegeben	Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen	Ausführendes Unternehmen
Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Baustellenbetrieb vorbereiten	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				Bei der Vorbereitung des Baustellenbetriebs beraten	Koordination
				SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen	Koordination
				Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen
				Erstellung Baustellenorganigramm	Ausführendes Unternehmen
				Kick-Off Besprechung durchführen	Ausführendes Unternehmen
Bei der Vorbereitung des Baustellenbetriebs beraten	Koordination	Beratungsprotokoll	Geteilt	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen	Koordination
				Baustellenbetrieb vorbereiten	Bauherr(-envertretung)
Baustellenbetrieb vorbereiten	Bauherr(-envertretung)	Optimierter Bauablaufplan	Freigegeben	Objekt- und Bauablaufüberwachung abstimmen	Bauherr(-envertretung)
				Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Koordination
Objekt- und Bauablaufüberwachung abstimmen	Bauherr(-envertretung)	Abstimmungsprotokoll	Freigegeben	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen	Koordination
SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen	Koordination	SiGePlan	3. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung fortschreiben	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen
				Bauleitung durchführen	Bauherr(-envertretung)
				Sicherheitseinrichtungen überprüfen	Koordination
				Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Koordination
		Sicherheits und Gesundheitsschutzplan AV	Freigegeben		
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben	Ausführendes Unternehmen	Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen
				Bauleitung durchführen	Bauherr(-envertretung)
				Aufzeichnungen über die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit erstellen	Ausführendes Unternehmen
Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen	Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen
				Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Leistungen ausführen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Leistungen ausführen	Ausführendes Unternehmen	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Regiebericht erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Qualitätsprotokolle erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Kostenmeldung erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Aufmaß erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Fertigstellungsmitteilung erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Technische Vorbegehungen	Ausführendes Unternehmen
				Abnahme mit Mängelliste	Ausführendes Unternehmen
				Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen	Ausführendes Unternehmen
				Nachkalkulation erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Analyseabschlussgespräch führen	Ausführendes Unternehmen
				Bautagebuch führen	Ausführendes Unternehmen
				Material prüfen	Ausführendes Unternehmen


Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				Vearbeitung prüfen	Ausführendes Unternehmen
				Verursacher festlegen	Ausführendes Unternehmen
				Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen
Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen	Wirksamkeitsbestätigung	Freigegeben	Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen	Dokumentiertes Arbeitsverfahren	Geteilt	Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Koordination
				Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen	Ausführendes Unternehmen
				Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Eigentümer(-vertretung)
Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Koordination	Protokoll der Überwachung	1. Bearbeitung	Dokumentation auswerten	Koordination
				Sicherheitsbesprechungen organisieren und durchführen	Koordination
Sicherheitsbesprechun-	Koordination	Protokoll der Sicherheits-	1. Bearbeitung	Dokumentation auswerten	Koordination

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
gen organisieren und durchführen		besprechungen		Sicherheitsbegehungen organisieren und durchführen	Koordination
Sicherheitsbegehungen organisieren und durchführen	Koordination	Protokoll der Sicherheitsbegehungen	1. Bearbeitung	Dokumentation auswerten	Koordination
Sicherheitseinrichtungen überprüfen	Koordination	Protokoll der Überprüfung	1. Bearbeitung	Dokumentation auswerten	Koordination
Dokumentation auswerten	Koordination	Protokoll der Arbeitsergebnisse	Geteilt	Bauleitung durchführen	Bauherr(-envertretung)
Bauleitung durchführen	Bauherr(-envertretung)	Protokoll der Bauleitung	Freigegeben	Bauleistung abnehmen	Bauherr(-envertretung)

6.1 Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen



Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Informationszusammenstellung	2. Bearbeitung	Informationszusammenstellung durchführen	
Gefährdungen ermitteln	Auflistung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	2. Bearbeitung	Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungen bewerten	Tabelle Gefährdungen	2. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
Schutzmaßnahmen festlegen	Tabelle Gefährdungen	2. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
	Tabelle Gefährdungsbewertungen	2. Bearbeitung	Gefährdungen bewerten	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Auflistung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	2. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungen ermitteln	Tabelle Gefährdungen	2. Bearbeitung	Gefährdungen bewerten	Ausführendes Unternehmen
			Schutzmaßnahmen festlegen	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungen bewerten	Tabelle Gefährdungsbewertungen	2. Bearbeitung	Schutzmaßnahmen festlegen	Ausführendes Unternehmen
Schutzmaßnahmen festlegen	Tabelle Schutzmaßnahmen	2. Bearbeitung		

6.2 Projektsicherheitsplan erstellen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen



Prozess	Inputs		Ist Output von...	
	Bezeichnung	Status	Prozess	...mit Verantwortlichem
Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen	Ausführendes Unternehmen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV	Ausführendes Unternehmen
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren	Ausführendes Unternehmen
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen	Ausführendes Unternehmen
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen	Ausführendes Unternehmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen	Ausführendes Unternehmen
Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen	Ausführendes Unternehmen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV	Ausführendes Unternehmen
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren	Ausführendes Unternehmen
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen	Ausführendes Unternehmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Sicherheitsrelevante Aspekte		Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung	Ausführendes Unternehmen
	Auf Bauverfahren abgestimmte		Montage-Teilelemente auf Bau-	Ausführendes Unternehmen


Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Teilelemente		verfahren abstimmen	

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung	Sicherheitsrelevante Aspekte		Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte	Ausführendes Unternehmen
			Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte	Sicherheitskonforme Abwicklungsmaßnahmen für sicherheitsrelevante Aspekte		Zusammenstellung Aufgaben	Ausführendes Unternehmen
			Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen

6.3 Leistungen ausführen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen



Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Ausführungsdaten festhalten	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Witterung festhalten	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedinugungen erfassen	Ausführendes Unternehmen
Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen	Ausführendes Unternehmen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedinugungen erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Lagerkapazitätsliste Fertigung		Lagerkapazitäten übernehmen	Ausführendes Unternehmen
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen	Ausführendes Unternehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen	Ausführendes Unternehmen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen	Ausführendes Unternehmen
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen	Ausführendes Unternehmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen	Ausführendes Unternehmen
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen	Ausführendes Unternehmen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Angepasste tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen	Ausführendes Unternehmen
Ausführende Mitarbeiter festhalten	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Bauablauffliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen	Ausführendes Unternehmen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen	Ausführendes Unternehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen	Ausführendes Unternehmen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen	Ausführendes Unternehmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen	Ausführendes Unternehmen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
Ausführungszeiten festhalten	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Bauablauffliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten	Ausführendes Unternehmen
Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)	Ausführendes Unternehmen	
Verwendete Materialien aufschreiben	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Bauablauffliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen	Ausführendes Unternehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen	Ausführendes Unternehmen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen	Ausführendes Unternehmen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen	Ausführendes Unternehmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen	Ausführendes Unternehmen
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen	Ausführendes Unternehmen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)	Ausführendes Unternehmen
Verwendete Geräte aufschreiben	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen	Ausführendes Unternehmen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltext-		Protokoll (Jour-Fix-Extern) fest-	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	liste (Gewährleistung)		halten(Gewährleistung)	
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen	Ausführendes Unternehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen	Ausführendes Unternehmen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen	Ausführendes Unternehmen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen	Ausführendes Unternehmen
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen	Ausführendes Unternehmen
	Geräte Logistik		Geräte Logistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Personen Logistik		Personen Logistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Material Logistik		Material Logistik planen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen	Ausführendes Unternehmen
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen	Ausführendes Unternehmen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Ausführungsdaten festhalten	Ausführungsdatenliste		Ausführungszeitraum festhalten	Ausführendes Unternehmen
			Objekt Daten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Ausführende auflisten	Ausführendes Unternehmen
			Protokollzeitraum erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Unternehmensdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
			Objektdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Berichtskopfdaten vergeben	Ausführendes Unternehmen
			Ausführungszeitraum übernehmen	Ausführendes Unternehmen
			Bautagesberichtskopfdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Fertigstellungsmittelungstext	Ausführendes Unternehmen
			Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen
Witterung festhalten	Herstellungs Witterungsliste		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Einbaurandbedinugungen erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Prüfdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Witterung übernehmen	Ausführendes Unternehmen
Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)	Herstellungsleistungsliste		Mengen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
			Ausführungszeiten festhalten	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
			Einbaurandbedinugungen erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Prüfdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Ausgeführte Leistung übernehmen	Ausführendes Unternehmen
			Ausgeführte Leistung übernehmen	Ausführendes Unternehmen
			Fotodokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Fertigstellungsmittelungstext	Ausführendes Unternehmen
			Allg. Beschreibung was - wie begangen wird	Ausführendes Unternehmen
			Mängelliste	Ausführendes Unternehmen
			Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)	Ausführendes Unternehmen
			Mängelliste (Abnahme)	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Verwendete Materialien aufschreiben	Ausführendes Unternehmen


Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
			Verwendete Geräte aufschreiben	Ausführendes Unternehmen
			Aufmaßpläne zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
Ausführende Mitarbeiter festhalten	Herstellungsmitarbeiterliste		Mängelliste	Ausführendes Unternehmen
			Mängelliste (Abnahme)	Ausführendes Unternehmen
			Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Mitarbeiterqualifikation (Facharbeiter, Helfer, Lehrling, Polier, Meister) erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Anzahl Unternehmen erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Anzahl Mitarbeiter erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Personaleinsatzliste zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
			Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
			Schlussmengen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
			Ist-Kostenliste	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Prüfdaten Gewährleistungs-	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
			mangel Material erfassen	
			Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Ausführende auflisten	Ausführendes Unternehmen
			Ausführungszeiten festhalten	Ausführendes Unternehmen
Ausführungszeiten festhalten	Herstellungszeitenliste		Lieferscheinlisten führen	Ausführendes Unternehmen
			Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Prüfdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Ausführungszeiten übernehmen	Ausführendes Unternehmen
			Einsatzzeiten übernehmen	Ausführendes Unternehmen
			Ausgeführte Leistung übernehmen	Ausführendes Unternehmen
			Personaleinsatzliste zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
			Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
			Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
			Schlussmengen ermitteln	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
			Ist-Kostenliste	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
Verwendete Materialien aufschreiben	Herstellungsmaterialliste		Schlussmengen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
			Materialhersteller auflisten	Ausführendes Unternehmen
			Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Verwendete Materialien übernehmen	Ausführendes Unternehmen
			Ausgeführte Leistung übernehmen	Ausführendes Unternehmen
			Fotodokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Lieferscheinlisten führen	Ausführendes Unternehmen
			Materialeinsatzliste zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
			Mengen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
			Mängelliste	Ausführendes Unternehmen
			Mängelliste (Abnahme)	Ausführendes Unternehmen
			Ist-Kostenliste	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
			Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
Verwendete Geräte aufschreiben	Herstellungsgäreliste		Lieferscheinlisten führen	Ausführendes Unternehmen
			Prüfdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen	Ausführendes Unternehmen
			Ausgeführte Leistung übernehmen	Ausführendes Unternehmen
			Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
			Mengen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
			Schlussmengen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
			Ist-Kostenliste	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen

7 Abnahme und Vorbereitung der Nutzung und Instandhaltung

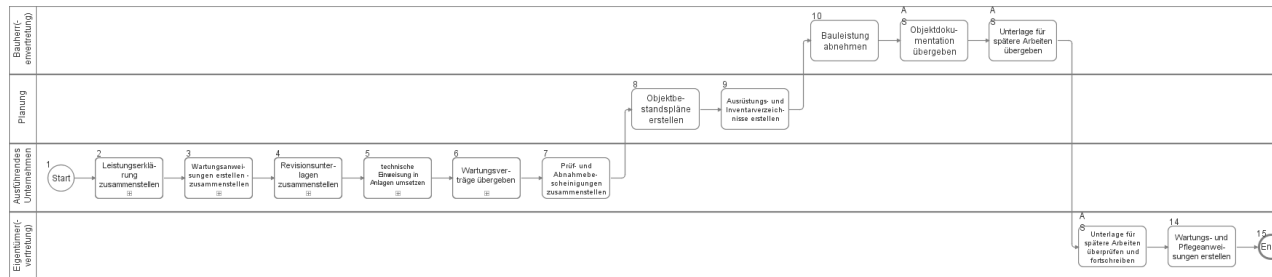

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Leistungserklärung zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen	Bestellung	1. Bearbeitung	Bestellungen abrufen	Ausführendes Unternehmen
		Lieferschein extern	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben	Ausführendes Unternehmen
		Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zu-	Ausführendes Unterneh-

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				sammenstellen	men
		Protokooll über die Beseitigung von Mängeln aus der Abnahme	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung überwachen	Objektplaner
Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen	Ausführendes Unternehmen
		Technisches Vorbegehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Technische Vorbegehungen	Ausführendes Unternehmen
		Prüfprotokoll Technische Anlagen - Einrichtungen	1. Bearbeitung	Technische Anlagen und Einrichtungen prüfen	Ausführendes Unternehmen
		Leistungserklärung	Geteilt	Leistungserklärung zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Herstellerangaben		Unterlagen der Hersteller zusammenstellen	-
Revisionsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben	Bauherr/Eigentümer
technische Einweisung in Anlagen umsetzen	Ausführendes Unternehmen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen	Ausführendes Unternehmen
		Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Prüfprotokoll Technische	1. Bearbeitung	Technische Anlagen und	Ausführendes Unterneh-

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Anlagen - Einrichtungen		Einrichtugnen prüfen	men
		Leistungserklärung	Geteilt	Leistungserklärung zu- sammenstellen	Ausführendes Unterneh- men
		Wartungsanweisung	Geteilt	Wartungsanweisungen er- stellen - zusammenstellen	Ausführendes Unterneh- men
		Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zu- sammenstellen	Ausführendes Unterneh- men
		Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen	Ausführendes Unterneh- men
Wartungsverträge überge- ben	Ausführendes Unterneh- men	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour- Fix-Termine)) intern durchführen	Ausführendes Unterneh- men
		Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zu- sammenstellen	Ausführendes Unterneh- men
Prüf- und Abnahmebe- scheinigungen zusam- menstellen	Ausführendes Unterneh- men	Herstellerangaben		Unterlagen der Hersteller zusammenstellen	-
		Prüfprotokoll Technische Anlagen - Einrichtungen	1. Bearbeitung	Technische Anlagen und Einrichtugnen prüfen	Ausführendes Unterneh- men
Objektbestandspläne er- stellen	Planung	Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prü- fen und freigeben	Bauherr/Eigentümer
		Revisionsunterlagen	Geteilt	Revisionsunterlagen zu- sammenstellen	Ausführendes Unterneh- men
Ausrüstungs- und Inven- tarverzeichnisse erstellen	Planung	Bestandspläne	Geteilt	Objektbestandspläne er- stellen	Planung

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Prüf- und Abnahmebescheinigungen	Geteilt	Prüf- und Abnahmebescheinigungen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Wartungsverträge	Geteilt	Wartungsverträge übergeben	Ausführendes Unternehmen
		technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen	Ausführendes Unternehmen
		Wartungsanweisung	Geteilt	Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Leistungserklärung	Geteilt	Leistungserklärung zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
Bauleistung abnehmen	Bauherr(-envertretung)	Ausrüstungs- und Inventarverzeichnis	Geteilt	Ausrüstungs- und Inventarverzeichnisse erstellen	Planung
		Prüf- und Abnahmebescheinigungen	Geteilt	Prüf- und Abnahmebescheinigungen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Unterlage für spätere Arbeiten	2. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination
		Protokoll der Bauleitung	Freigegeben	Bauleitung durchführen	Bauherr(-envertretung)
		Prüfprotokoll Technische Anlagen - Einrichtungen	1. Bearbeitung	Technische Anlagen und Einrichtungen prüfen	Ausführendes Unternehmen
		Abnahmeprotokoll der Bauleistung	Freigegeben	Bauleistung abnehmen	Bauherr(-envertretung)
Objektdokumentation	Bauherr(-envertretung)	Bestandspläne	Geteilt	Objektbestandspläne er-	Planung

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
übergeben				stellen	
		Ausrüstungs- und Inventarverzeichnis	Geteilt	Ausrüstungs- und Inventarverzeichnisse erstellen	Planung
		Prüf- und Abnahmebescheinigungen	Geteilt	Prüf- und Abnahmebescheinigungen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Prüfprotokoll Technische Anlagen - Einrichtungen	1. Bearbeitung	Technische Anlagen und Einrichtungen prüfen	Ausführendes Unternehmen
		Wartungsverträge	Geteilt	Wartungsverträge übergeben	Ausführendes Unternehmen
		technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen	Ausführendes Unternehmen
		Wartungsanweisung	Geteilt	Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Leistungserklärung	Geteilt	Leistungserklärung zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Abnahmeprotokoll der Bauleistung	Freigegeben	Bauleistung abnehmen	Bauherr(-envertretung)
Unterlage für spätere Arbeiten übergeben	Bauherr(-envertretung)	Unterlage für spätere Arbeiten	2. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen	Koordination
		Objektdokumentation	Freigegeben	Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
Unterlage für spätere Arbeiten überprüfen und	Eigentümer(-vertretung)	Unterlage für spätere Arbeiten	Freigegeben	Unterlage für spätere Arbeiten übergeben	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
fortschreiben		Objektdokumentation	Freigegeben	Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
		Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben	Bauherr/Eigentümer
Wartungs- und Pflegeanweisungen erstellen	Eigentümer(-vertretung)	Unterlage für spätere Arbeiten	3. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten überprüfen und fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)
		Objektdokumentation	Freigegeben	Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Leistungserklärung zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen	Leistungserklärung	Geteilt	Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
				technische Einweisung in Anlagen umsetzen	Ausführendes Unternehmen
				Dokumentationen prüfen	Objektplaner
				Ausrüstungs- und Inventarverzeichnisse erstellen	Planung
				Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
				Projektdokumentation zusammenstellen	-

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen	Wartungsanweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen	Ausführendes Unternehmen
				Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)	Ausführendes Unternehmen
				Dokumentationen prüfen	Objektplaner
				Analyseabschlussgespräch führen	Ausführendes Unternehmen
				Ausrüstungs- und Inventarverzeichnisse erstellen	Planung
				Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
				Projektdokumentation zusammenstellen	-
Revisionsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen	Revisionsunterlagen	Geteilt	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)	Ausführendes Unternehmen
				Dokumentationen prüfen	Objektplaner
				Objektbestandspläne erstellen	Planung
				Projektdokumentation zusammenstellen	-
technische Einweisung in Anlagen umsetzen	Ausführendes Unternehmen	technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)	Ausführendes Unternehmen
				Material prüfen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				Vearbeitung prüfen	Ausführendes Unternehmen
				Verursacher festlegen	Ausführendes Unternehmen
				Dokumentationen prüfen	Objektplaner
				Ausrüstungs- und Inventarverzeichnisse erstellen	Planung
				Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
				Projektdokumentation zusammenstellen	-
Wartungsverträge übergeben	Ausführendes Unternehmen	Wartungsverträge	Geteilt	Dokumentationen prüfen	Objektplaner
				Ausrüstungs- und Inventarverzeichnisse erstellen	Planung
				Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
				Projektdokumentation zusammenstellen	-
Prüf- und Abnahmebescheinigungen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen	Prüf- und Abnahmebescheinigungen	Geteilt	Ausrüstungs- und Inventarverzeichnisse erstellen	Planung
				Bauleistung abnehmen	Bauherr(-envertretung)
				Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
				Unterlagen zur Durchführung	Eigentümer(-vertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				rung auf Vollständigkeit prüfen	
Objektbestandspläne erstellen	Planung	Bestandspläne	Geteilt	Ausrüstungs- und Inventarverzeichnisse erstellen	Planung
				Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
				Unterlagen zur Durchführung auf Vollständigkeit prüfen	Eigentümer(-vertretung)
Ausrüstungs- und Inventarverzeichnisse erstellen	Planung	Ausrüstungs- und Inventarverzeichnis	Geteilt	Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
				Bauleistung abnehmen	Bauherr(-envertretung)
				Unterlagen zur Durchführung auf Vollständigkeit prüfen	Eigentümer(-vertretung)
Bauleistung abnehmen	Bauherr(-envertretung)	Abnahmeprotokoll der Bauleistung	Freigegeben	Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
				Bauleistung abnehmen	Bauherr(-envertretung)
Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)	Objektdokumentation	Freigegeben	Unterlage für spätere Arbeiten überprüfen und fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)
				Wartungs- und Pflegeanweisungen erstellen	Eigentümer(-vertretung)
				Unterlage für spätere Ar-	Bauherr(-envertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				beiten übergeben	
				Unterlagen zur Durchführung auf Vollständigkeit prüfen	Eigentümer(-vertretung)
Unterlage für spätere Arbeiten übergeben	Bauherr(-envertretung)	Unterlage für spätere Arbeiten	Freigegeben	Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot	-
				Unterlage für spätere Arbeiten überprüfen und fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)
				Dokumentationsunterlagen prüfen und freigeben	Projektsteuerer Bauherr/Eigentümer
				Betreiberkonzept finalisieren	Bauherr/Eigentümer
Unterlage für spätere Arbeiten überprüfen und fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)	Unterlage für spätere Arbeiten	3. Bearbeitung	Wartungs- und Pflegeanweisungen erstellen	Eigentümer(-vertretung)
				Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen
				(Betriebs-) Beauftragte verantwortliche Personen benennen	Bauherr/Eigentümer
				Unterlagen zur Durchführung auf Vollständigkeit prüfen	Eigentümer(-vertretung)
Wartungs- und Pflegean-	Eigentümer(-vertretung)	Wartungs- und Pflegean-	Geteilt	Vertragsbedingungen	Bauherr/Eigentümer

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
weisungen erstellen		weisung		festlegen	
				Unterlagen zur Durchführung auf Vollständigkeit prüfen	Eigentümer(-vertretung)

7.1 Leistungserklärung zusammenstellen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen



Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Herstellerverzeichnis zusammenstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln	Ausführendes Unternehmen
	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln	Ausführendes Unternehmen
	Lieferantenliste		Lieferanten festlegen	Ausführendes Unternehmen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Soll-Ist Vergleichsliste Liefere-		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	rung (Gewährleistung)		erstellen (Gewährleistung)	
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
Produktdatenblätter zusammenstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln	Ausführendes Unternehmen
	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln	Ausführendes Unternehmen
	Lieferantenliste		Lieferanten festlegen	Ausführendes Unternehmen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
REACH-Datenblätter zusammenstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln	Ausführendes Unternehmen
	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln	Ausführendes Unternehmen
	Lieferantenliste		Lieferanten festlegen	Ausführendes Unternehmen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
Text Leistungserklärungans schreiben	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	REACH-Datenblätterliste		REACH-Datenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltext-		Protokoll (Jour-Fix-Extern) fest-	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	liste		halten	
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen


Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Herstellerverzeichnis zusammenstellen	Produktherstellerverzeichnisliste		Produktdatenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
			REACH-Datenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
			Text Leistungserklärung schreiben	Ausführendes Unternehmen
			Wartungsbeschreibung erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Kenndatenliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Einweisungstext	Ausführendes Unternehmen
			Wartungsdatumsliste aufstellen	Ausführendes Unternehmen
Produktdatenblätter zusammenstellen	Produktdatenblätterliste		REACH-Datenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
			Text Leistungserklärung schreiben	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
			schreiben	
			Wartungsdatumsliste aufstellen	Ausführendes Unternehmen
			Wartungsbeschreibung erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Kenndatenliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Anlagennummer	Ausführendes Unternehmen
			Einweisungstext	Ausführendes Unternehmen
REACH-Datenblätter zusammenstellen	REACH-Datenblätterliste		Text Leistungserklärung schreiben	Ausführendes Unternehmen
			Wartungsbeschreibung erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Kenndatenliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Einweisungstext	Ausführendes Unternehmen
Text Leistungserklärung schreiben	Leistungserklärungsanschriftentextliste			

7.2 Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen



Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Wartungsbeschreibung erstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen	Ausführendes Unternehmen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen	Ausführendes Unternehmen
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird	Ausführendes Unternehmen
	Anlagenortliste Technische Prüfung		Anlagenort dokumentieren	Ausführendes Unternehmen
	Anlagenklassifizierungsliste		Anlagenklassifizierung prüfen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Technische Prüfung			
	Prüfungsbeschreibungliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben	Ausführendes Unternehmen
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren	Ausführendes Unternehmen
	Gefährdungsbeschreibungliste Technische Prüfung		Gefährdung beschreiben	Ausführendes Unternehmen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusam- menstellen	Ausführendes Unternehmen
	REACH-Datenblätterliste		REACH-Datenblätter zusam- menstellen	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zu- sammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextlis- te		Protokoll (Jour-Fix-Intern) fest- halten	Ausführendes Unternehmen
	Produktherstellerverzeichnislis- te		Herstellerverzeichnis zusam- menstellen	Ausführendes Unternehmen
Wartungsdatumsliste aufstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltext- liste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) fest- halten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextlis- te		Protokoll (Jour-Fix-Intern) fest- halten	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Produktherstellerverzeichnislis-		Herstellerverzeichnis zusam-	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	te		menstellen	
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
Kenndatenliste erstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Leistungsbeschreibungliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen	Ausführendes Unternehmen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen	Ausführendes Unternehmen
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird	Ausführendes Unternehmen
	Anlagenortliste Technische Prüfung		Anlagenort dokumentieren	Ausführendes Unternehmen
	Anlagenklassifizierungsliste Technische Prüfung		Anlagenklassifizierung prüfen	Ausführendes Unternehmen
	Prüfungsbeschreibungliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben	Ausführendes Unternehmen
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren	Ausführendes Unternehmen
	Gefährdungsbeschreibungliste		Gefährdung beschreiben	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Technische Prüfung			
	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	REACH-Datenblätterliste		REACH-Datenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen	Ausführendes Unternehmen
	Wartungsbeschreibungsliste		Wartungsbeschreibung erstellen	Ausführendes Unternehmen
Wartungsabbildungsliste erstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Fotoliste		Fotodokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird	Ausführendes Unternehmen
	Anlagenortsliste Technische Prüfung		Anlagenort dokumentieren	Ausführendes Unternehmen
	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren	Ausführendes Unternehmen
	Gefährdungsbeschreibungliste Technische Prüfung		Gefährdung beschreiben	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Wartungsbeschreibungliste		Wartungsbeschreibung erstellen	Ausführendes Unternehmen
Austauschmaterialliste erstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird	Ausführendes Unternehmen
	Prüfungsbeschreibungliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben	Ausführendes Unternehmen
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Wartungsbeschreibungliste		Wartungsbeschreibung erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Kenndatenliste		Kenndatenliste erstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Wartungsintervallliste erstellen	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)	Ausführendes Unternehmen
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird	Ausführendes Unternehmen
	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben	Ausführendes Unternehmen
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammensetzen	Ausführendes Unternehmen
	Wartungsbeschreibungsliste		Wartungsbeschreibung erstellen	Ausführendes Unternehmen
Kenndatenliste		Kenndatenliste erstellen	Ausführendes Unternehmen	


Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Wartungsbeschreibung erstellen	Wartungsbeschreibungsliste		Wartungsabbildungsliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Austauschmaterialliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Wartungsintervallliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Einweisungstext	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Mangelbeschreibung prüfen	Ausführendes Unternehmen
			Kenndatenliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
Wartungsdatumsliste aufstellen	Wartungsdatumsliste		Mangelbeschreibung prüfen	Ausführendes Unternehmen
Kenndatenliste erstellen	Kenndatenliste		Austauschmaterialliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Wartungsintervallliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Anlagennummer	Ausführendes Unternehmen
			Einweisungstext	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Mangelbeschreibung prüfen	Ausführendes Unternehmen
Wartungsabbildungsliste erstellen	Wartungsabbildungsliste		Einweisungstext	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
Austauschmaterialliste erstellen	Austauschmaterialliste		Einweisungstext	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
			ten erfassen	
			Mangelbeschreibung prüfen	Ausführendes Unternehmen
Wartungsintervallliste erstellen	Wartungsintervallliste		Einweisungstext	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Mangelbeschreibung prüfen	Ausführendes Unternehmen

7.3 Revisionsunterlagen zusammenstellen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen




Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Anschreibetext Revisionsunterlagen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammensetzen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Anschreibetext Revisionsunterlagen	Anschreibetextliste Revisionsunterlagen			

7.4 technische Einweisung in Anlagen umsetzen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen



Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Laufende Nummer	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammensetzen	Ausführendes Unternehmen
Datum	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen	Ausführendes Unternehmen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen	Ausführendes Unternehmen
	Fertigstellungsmitteilungstextliste		Fertigstellungsmitteilungstext	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Dauer Teilleistungen		Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten	Ausführendes Unternehmen
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
Anlagennummer	Anlagenortliste Technische Prüfung		Anlagenort dokumentieren	Ausführendes Unternehmen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Kenndatenliste		Kenndatenliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
Vertragsparteien	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltext-		Protokoll (Jour-Fix-Extern) fest-	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
	liste		halten	
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
Einweisungstext	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen	Ausführendes Unternehmen
	Anlagenklassifizierungsliste Technische Prüfung		Anlagenklassifizierung prüfen	Ausführendes Unternehmen
	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben	Ausführendes Unternehmen
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren	Ausführendes Unternehmen
	Gefährdungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Gefährdung beschreiben	Ausführendes Unternehmen
	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	REACH-Datenblätterliste		REACH-Datenblätter zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
			menstellen	
	Wartungsbeschreibungsliste		Wartungsbeschreibung erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Kenndatenliste		Kenndatenliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Wartungsabbildungsliste		Wartungsabbildungsliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Austauschmaterialliste		Austauschmaterialliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Wartungsintervallliste		Wartungsintervallliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Anlagennummernliste Technische Einweisung		Anlagennummer	Ausführendes Unternehmen
Unterschriftenliste	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		Vertragsparteien	Ausführendes Unternehmen


Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Laufende Nummer	Laufende Nummernliste Technische Einweisung			
Datum	Datumsliste Technische Einweisung		Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen
Anlagennummer	Anlagennummernliste Technische Einweisung		Einweisungstext	Ausführendes Unternehmen
			Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Materialhersteller auflisten	Ausführendes Unternehmen
			Mangelbeschreibung prüfen	Ausführendes Unternehmen
Vertragsparteien	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		Vertragsparteien (Abnahme)	Ausführendes Unternehmen
			Unterschriftenliste	Ausführendes Unternehmen
			Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen	Ausführendes Unternehmen
			Vertragsdaten prüfen	Ausführendes Unternehmen
			Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
			Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Ausführende auflisten	Ausführendes Unternehmen
Einweisungstext	Einweisungstextliste Technische Einweisung		Mangelbeschreibung prüfen	Ausführendes Unternehmen
			Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Ausführendes Unternehmen
			Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Ausführendes Unternehmen
Unterschriftenliste	Unterschriftenliste Technische Einweisung			

7.5 Wartungsverträge übergeben

Verantwortlicher


Ausführendes Unternehmen



Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Wartungsvertragstext	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Ausführendes Unternehmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammensstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Wartungsvertragstext	Wartungsvertragstextliste			

8 Instandhaltung



Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Unterlagen zur Durchführung auf Vollständigkeit prüfen	Eigentümer(-vertretung)	Unterlage für spätere Arbeiten	3. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten überprüfen und fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)
		Nutzungskonzept	Freigegeben	Nutzungskonzept erstellen	-
		Notfallkonzept		Notfallkonzept erstellen	-
		Auflistung der Projektbeteiligten	Geteilt	Projektbeteiligte erstellen	-
		Prüf- und Abnahmebescheinigungen	Geteilt	Prüf- und Abnahmebescheinigungen zusammenstellen	Ausführendes Unternehmen
		Ausrüstungs- und Inventarverzeichnis	Geteilt	Ausrüstungs- und Inventarverzeichnisse erstellen	Planung
		Objektdokumentation	Freigegeben	Objektdokumentation übergeben	Bauherr(-envertretung)
		Wartungs- und Pflegeanweisung	Geteilt	Wartungs- und Pflegeanweisungen erstellen	Eigentümer(-vertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Bestandspläne	Geteilt	Objektbestandspläne erstellen	Planung
		Betreiberkonzept	Freigegeben	Betreiberkonzept prüfen und freigeben	Bauherr/Eigentümer
		Brandschutzkonzept	Geteilt	Brandschutzkonzept teilen	sonstige Fachplaner
Zusammenarbeit der Unternehmer organisieren	Eigentümer(-vertretung)	Vertragsspezifische Zusammenstellung	Freigegeben	Unterlagen zur Durchführung auf Vollständigkeit prüfen	Eigentümer(-vertretung)
		Mitteilung über die Bestellung verantwortlicher Personen	Archiviert	(Betriebs-) Beauftragte verantwortliche Personen benennen	Bauherr/Eigentümer
Kontrollen (Soll/Ist-Vergleiche) organisieren	Eigentümer(-vertretung)	Ablaufplan	1. Bearbeitung	Zusammenarbeit der Unternehmer organisieren	Eigentümer(-vertretung)
Unterweisung	Eigentümer(-vertretung)	Notfallkonzept		Notfallkonzept erstellen	-
		Hausordnung		Hausordnung erstellen	-
		Gefahrstoffkataster		Gefahrstoffkataster erstellen	-
		Betriebsanweisung		Betriebsanweisung erstellen	-
		Objektbeschreibung		Objektbeschreibung erstellen	-
		Unterlage für spätere Arbeiten, gewerkespezifisch	Freigegeben	Gewerkespezifische Unterlage für spätere Arbeiten	Eigentümer(-vertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				ten erstellen	
		Umweltrelevante Informationen		Umweltrelevante Informationen zusammenstellen	-
		Brandschutzkonzept	Geteilt	Brandschutzkonzept teilen	sonstige Fachplaner
Arbeitsverfahren vorbereiten	Ausführendes Unternehmen	Vertragsspezifische Zusammenstellung	Freigegeben	Unterlagen zur Durchführung auf Vollständigkeit prüfen	Eigentümer(-vertretung)
		Unterweisungsprotokoll	Freigegeben	Unterweisung	Eigentümer(-vertretung)
Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen	Arbeitsschutzmanagementsystem	1. Bearbeitung	Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen	Ausführendes Unternehmen
		Objektspezifische Information für die GB; AV	1. Bearbeitung	Arbeitsverfahren vorbereiten	Ausführendes Unternehmen
		Unterlage für spätere Arbeiten	3. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten überprüfen und fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)
Unterweisung durchführen	Ausführendes Unternehmen	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen
Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen
		Unterweisungsnachweis	Freigegeben	Unterweisung durchführen	Ausführendes Unternehmen
Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Arbeiten durchführen	Ausführendes Unternehmen	Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Vertragsspezifische Zusammenstellung	Freigegeben	Unterlagen zur Durchführung auf Vollständigkeit prüfen	Eigentümer(-vertretung)
Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen	Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Arbeitsprotokoll	Freigegeben	Arbeiten durchführen	Ausführendes Unternehmen
Maßnahmen anpassen	Ausführendes Unternehmen	Wirksamkeitsüberprüfung	Freigegeben	Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen
		Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen
Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Maßnahmen anpassen	Ausführendes Unternehmen
		Wirksamkeitsüberprüfung	Freigegeben	Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen
		Arbeitsprotokoll	Freigegeben	Arbeiten durchführen	Ausführendes Unternehmen
		Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen
Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Eigentümer(-vertretung)	Dokumentiertes Arbeitsverfahren	Geteilt	Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
		Unterweisungsprotokoll	Freigegeben	Unterweisung	Eigentümer(-vertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
		Ablaufplan	1. Bearbeitung	Zusammenarbeit der Unternehmer organisieren	Eigentümer(-vertretung)
Sicherheitsbesprechungen organisieren und durchführen	Eigentümer(-vertretung)	Protokoll der Überwachung	1. Bearbeitung	Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Eigentümer(-vertretung)
Sicherheitsbegehungen organisieren und durchführen	Eigentümer(-vertretung)	Protokoll der Sicherheitsbesprechungen	1. Bearbeitung	Sicherheitsbesprechungen organisieren und durchführen	Eigentümer(-vertretung)
Kontrollen (Soll/Ist-Vergleiche) durchführen	Eigentümer(-vertretung)	Kontrollablauf	1. Bearbeitung	Kontrollen (Soll/Ist-Vergleiche) organisieren	Eigentümer(-vertretung)
Dokumentation auswerten	Eigentümer(-vertretung)	Protokoll der Überprüfung	1. Bearbeitung	Kontrollen (Soll/Ist-Vergleiche) durchführen	Eigentümer(-vertretung)
		Protokoll der Sicherheitsbegehungen	1. Bearbeitung	Sicherheitsbegehungen organisieren und durchführen	Eigentümer(-vertretung)
		Protokoll der Sicherheitsbesprechungen	1. Bearbeitung	Sicherheitsbesprechungen organisieren und durchführen	Eigentümer(-vertretung)
		Protokoll der Überwachung	1. Bearbeitung	Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Eigentümer(-vertretung)
Unterlage für spätere Arbeiten fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Maßnahmen anpassen	Ausführendes Unternehmen
		Protokoll der Arbeitsergebnisse	Geteilt	Dokumentation auswerten	Eigentümer(-vertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Inputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Objektdokumentation fort-schreiben	Eigentümer(-vertretung)	Protokoll der Arbeitser-gbnisse	Geteilt	Dokumentation auswerten	Eigentümer(-vertretung)
		Unterlage für spätere Ar-beiten	4. Bearbeitung	Unterlage für spätere Ar-beiten fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
Unterlagen zur Durchfüh-rung auf Vollständigkeit prüfen	Eigentümer(-vertretung)	Vertragsspezifische Zu-sammenstellung	Freigegeben	Arbeitsverfahren vorberei-ten	Ausführendes Unterneh-men
				Zusammenarbeit der Un-ternehmer organisieren	Eigentümer(-vertretung)
				Arbeiten durchführen	Ausführendes Unterneh-men
Zusammenarbeit der Un-ternehmer organisieren	Eigentümer(-vertretung)	Ablaufplan	1. Bearbeitung	Überwachung der Anwen-dung der Arbeitsverfahren koordinieren	Eigentümer(-vertretung)
				Kontrollen (Soll/Ist-Ver-gleiche) organisieren	Eigentümer(-vertretung)
Kontrollen (Soll/Ist-Ver-gleiche) organisieren	Eigentümer(-vertretung)	Kontrollablauf	1. Bearbeitung	Kontrollen (Soll/Ist-Ver-gleiche) durchführen	Eigentümer(-vertretung)
Unterweisung	Eigentümer(-vertretung)	Unterweisungsprotokoll	Freigegeben	Arbeitsverfahren vorberei-ten	Ausführendes Unterneh-men
				Überwachung der Anwen-	Eigentümer(-vertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				dung der Arbeitsverfahren koordinieren	
Arbeitsverfahren vorbereiten	Ausführendes Unternehmen	Objektspezifische Information für die GB; AV	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Ausführendes Unternehmen	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Unterweisung durchführen	Ausführendes Unternehmen
				Maßnahmen anpassen	Ausführendes Unternehmen
				Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Arbeitsmittel bereitstellen	Ausführendes Unternehmen
Unterweisung durchführen	Ausführendes Unternehmen	Unterweisungsnachweis	Freigegeben	Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen
Projektsicherheitsplan erstellen	Ausführendes Unternehmen	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen
Maßnahmen durchführen	Ausführendes Unternehmen	Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen
				Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
				Arbeiten durchführen	Ausführendes Unternehmen
Arbeiten durchführen	Ausführendes Unternehmen	Arbeitsprotokoll	Freigegeben	Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen


Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
				Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen	Ausführendes Unternehmen	Wirksamkeitsüberprüfung	Freigegeben	Maßnahmen anpassen	Ausführendes Unternehmen
				Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
Maßnahmen anpassen	Ausführendes Unternehmen	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Unterlage für spätere Arbeiten fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)
				Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen
Dokumentation erstellen	Ausführendes Unternehmen	Dokumentiertes Arbeitsverfahren	Geteilt		
Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren	Eigentümer(-vertretung)	Protokoll der Überwachung	1. Bearbeitung	Sicherheitsbesprechungen organisieren und durchführen	Eigentümer(-vertretung)
				Dokumentation auswerten	Eigentümer(-vertretung)
Sicherheitsbesprechungen organisieren und durchführen	Eigentümer(-vertretung)	Protokoll der Sicherheitsbesprechungen	1. Bearbeitung	Sicherheitsbegehungen organisieren und durchführen	Eigentümer(-vertretung)
				Dokumentation auswerten	Eigentümer(-vertretung)
Sicherheitsbegehungen organisieren und durchführen	Eigentümer(-vertretung)	Protokoll der Sicherheitsbegehungen	1. Bearbeitung	Dokumentation auswerten	Eigentümer(-vertretung)
Kontrollen (Soll/Ist-Ver-	Eigentümer(-vertretung)	Protokoll der Überprüfung	1. Bearbeitung	Dokumentation auswerten	Eigentümer(-vertretung)

Prozess	Verantwortlicher	Outputs			
		Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
				Prozess	...mit Verantwortlichem
gleiche) durchführen					
Dokumentation auswerten	Eigentümer(-vertretung)	Protokoll der Arbeitsergebnisse	Geteilt	Objektdokumentation fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)
				Unterlage für spätere Arbeiten fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)
Unterlage für spätere Arbeiten fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)	Unterlage für spätere Arbeiten	4. Bearbeitung	Objektdokumentation fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)
				Dokumentationen erstellen und fortschreiben	Bauherr/Eigentümer
Objektdokumentation fortschreiben	Eigentümer(-vertretung)	Objektdokumentation	2. Bearbeitung		

8.1 Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen



Prozess	Inputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Output von...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Informationszusammenstellung	2. Bearbeitung	Informationszusammenstellung durchführen	
Gefährdungen ermitteln	Auflistung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	1. Bearbeitung	Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungen bewerten	Tabelle Gefährdungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
Schutzmaßnahmen festlegen	Tabelle Gefährdungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
	Tabelle Gefährdungsbewertungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen bewerten	Ausführendes Unternehmen

Prozess	Outputs			
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...	
			Prozess	...mit Verantwortlichem
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Auflistung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	1. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungen ermitteln	Tabelle Gefährdungen	1. Bearbeitung	Schutzmaßnahmen festlegen	Ausführendes Unternehmen
			Gefährdungen bewerten	Ausführendes Unternehmen
Gefährdungen bewerten	Tabelle Gefährdungsbewertungen	1. Bearbeitung	Schutzmaßnahmen festlegen	Ausführendes Unternehmen
Schutzmaßnahmen festlegen	Tabelle Schutzmaßnahmen	1. Bearbeitung		

